

1. Cadrage du projet et compréhension du cas

Le contexte : Le numérique pollue beaucoup, et en tant qu'étudiants, nous ne sommes pas toujours bien formés aux bonnes pratiques (le "Green IT").

Notre mission : Organiser une "Journée Numérique Responsable" à l'IUT pour sensibiliser une centaine d'étudiants. La direction nous a imposé deux grandes règles : l'événement doit avoir lieu le jeudi 14 mai, et le budget total ne doit surtout pas dépasser 2 000 €.

2. Analyse des besoins et du périmètre du projet

Pour que l'événement rentre dans le budget de 2 000 € et respecte le thème écolo, nous avons dû faire des choix clairs sur ce qu'on garde et ce qu'on enlève :

- Ce qu'on garde (Inclus) : On réserve l'amphi de l'IUT et on utilise le matériel déjà sur place (micros, projecteur). On invite uniquement des pros et des profs de la région. Pour la nourriture, on prévoit un buffet d'accueil et une pause-café.
- Ce qu'on enlève (Exclus) : On ne fait aucune impression papier (zéro flyer). On ne paie pas de billets de train ou d'hôtels pour faire venir des gens de loin, et on ne prévoit pas de repas assis le midi car c'est hors budget.

3. Objectifs du projet et livrables attendus

Nos objectifs : * Réunir au moins 100 étudiants le 14 mai.

- Respecter la limite des 2 000 € TTC.
- Faire une communication 100 % numérique.

Les livrables (ce qu'on doit produire à la fin) :

1. L'événement en lui-même (la salle prête, les conférences).
2. Un kit de communication avec nos affiches pour les écrans et des QR codes.
3. Un "Mini-guide" en PDF que les étudiants pourront télécharger.
4. Ce dossier complet de gestion de projet.

4. Acteurs, organisation et gouvernance

Gérer un projet, ce n'est pas comme travailler dans une entreprise classique avec un chef et des employés. L'organisation ne repose pas sur la hiérarchie, mais sur la coordination.

Les rôles de chacun :

- La MOA (La Direction de l'IUT) : C'est le "client". C'est elle qui demande le projet, fixe le budget et la date. À la fin, c'est elle qui valide si l'objectif est atteint.
- La MOE (Notre groupe d'étudiants) : C'est nous qui réalisons concrètement le projet. On organise l'événement et on crée les livrables.
- Le Chef de Projet : Il n'est pas là pour donner des ordres, il fait le lien entre la direction (MOA) et l'équipe (MOE). Il surveille le planning, le budget, et propose des solutions en cas de problème.

La Gouvernance :


Pour éviter que le projet parte dans tous les sens ou qu'il y ait des conflits, on a défini des règles de validation claires. Par exemple : les grosses dépenses doivent être validées par la Direction, et nos affiches doivent être approuvées par le Service Com' de l'IUT avant d'être affichées. Cela permet de prendre des décisions vite et bien.

5. Répartition des rôles et responsabilités (Matrice RACI)

Pour éviter les conflits de responsabilités, les chevauchements et clarifier les dépendances (ex: un acteur qui réalise sans décider), nous utilisons une matrice RACI. Elle dissocie la réalisation (R) de l'autorité de validation (A).

Tâches (Issues du WBS)	Chef de Projet	MOE (Équipe projet)	MOA (Direction IUT)	Service Com' / Tech
Cadrage et suivi du budget	R	I	A	I
Recrutement des intervenants	A	R	I	I
Validation du Kit de Com'	C	R	I	A
Logistique (Matériel, Traiteur)	A	R	C	C

Partie 6 :

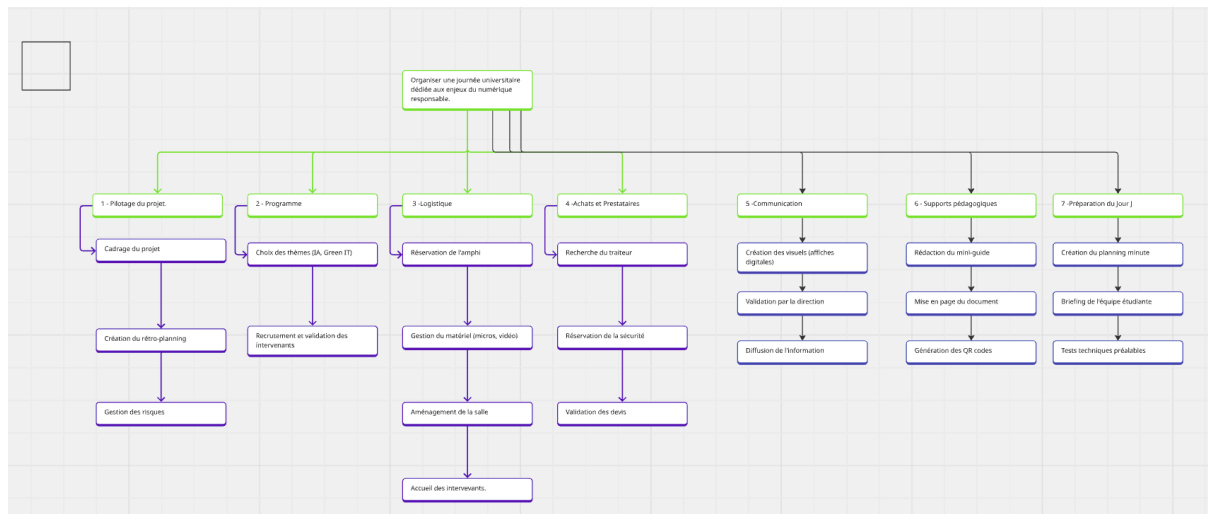

Partie 7 :

7. Planification du projet et dépendances

La planification repose sur un rétro-planning : nous partons de la date butoir du jeudi 14 mai pour fixer les échéances précédentes et garantir que l'événement soit prêt à temps.

A. Les dépendances critiques (Liaisons entre les tâches)

Le projet avance par étapes logiques. Certaines tâches sont "bloquantes" : si l'une traîne, tout le reste s'arrête.

- **Validation Direction → Tout le projet** : C'est la dépendance n°1. Tant qu'on n'a pas l'autorisation officielle de la direction de l'IUT, on ne peut rien faire .
- **Confirmation Intervenants → Communication** : On ne peut pas créer les affiches et le kit de com tant que les noms et les thèmes des interventions ne sont pas confirmés.
- **Validation Service Com → Diffusion** : Aucun support ne peut être envoyé aux étudiants sans le feu vert du service communication.

B. Calendrier des Jalons (Points de contrôle)

Les jalons sont les dates clés pour vérifier qu'on ne prend pas de retard sur le planning global.

Jalon	Étape clé terminée (issue du schéma)	Date limite
J1	Lancement validé : Cadrage et planning terminés (Branche 1)	31 Mars
J2	Contenu prêt : Thèmes et intervenants confirmés (Branche 2)	15 Avril
J3	Logistique verrouillée : Amphi réservé et devis validés (Branches 3 & 4)	25 Avril
J4	Com lancée : Visuels validés et diffusion commencée (Branche 5)	2 Mai
J5	Supports finis : Mini-guide et QR codes prêts (Branche 6)	10 Mai
J6	Réalisation : Journée Numérique Responsable (Branche 7)	14 Mai

Partie 8 :

Manque partie 7 :

Il nous a manqué le diagramme de Gantt et par cette gêne occasionnée on voulu se rattraper en vous donner un diagramme de Gantt d'exception (façonné avec l'IA) : <https://reliable-dusk-0833f9.netlify.app/> .

8. Budget prévisionnel et arbitrages

Le budget accordé par l'IUT est plafonné à 2 000 € maximum. L'objectif est de financer tout l'événement sans dépasser cette somme, tout en gardant une marge de sécurité pour les imprévus.

A. Tableau du budget prévisionnel

Pôle de dépense	À quoi ça sert ?	Montant
Logistique & Sécurité	Vigiles (obligatoire), ménage, location de petit matériel. 23/heure 1 vigile sur une base de 15 vigiles 345 euros + ménage environ 200 euros pour 5h + le reste pour la location	650 €
Traiteur	Buffet d'accueil et pause-café pour ~100 personnes. (https://instant-lunch.store/buffet-entreprise/?gad_source=1&gad_campaignid=23036378586&gbraid=0AAAABBZyW_wpUELFSGO0F3h5v9osvjQmX&gclid=Cj0KCQjw7ljOBhDyARIsAFzrWQwkuKdVDU0tZ28eRb_1cNAo7H14Pu_6zXchRh6vVGEbsWlztgQ6SJkaAqJeEALw_wcB)	200 €
Intervenants	Remboursement des transports et préparer leur matériel (flyer etc.) 2,55 le prix du tickets dcp il en faut 1 aller 1 retour sa fait donc 5,1 sur une base de 25 intervenants present sa fait 127,5le reste est pour les flyers et la securité si il des intervenants se rajoute	180 €

Communication	2 grandes affiches (souvent kakemonos) et badges pour le staff (le reste est gratuit/digital). kakemonos = 2* = 70–80 euros + badges a l'unité 0,50 a 1 euros.	150 €
Marge de sécurité	Réserve de 20% en cas d'imprévu (hausse de prix, casse).	400 €
TOTAL	Respect de l'enveloppe	1 580 €

Il reste du budget donc si il faut ajouter pour les manquements on ajoute.

B. Nos arbitrages

Pour respecter notre budget plafond de 2 000 € et même faire de belles économies (notre total prévu est de 1 580 €), nous avons fait des choix logiques alignés avec notre thème éco-responsable :

1. La limitation maximale du papier : On a supprimé l'impression massive de livrets pour les étudiants. La communication passe presque entièrement par les écrans de l'IUT et des QR codes. C'est gratuit et plus écolo (on garde juste un petit budget pour deux grandes affiches et les intervenants).
2. Des intervenants locaux : On invite uniquement des pros de la région ou des profs de l'IUT. Ça nous évite de payer des nuits d'hôtel ou des billets de TGV hors de prix.
3. Un buffet plutôt qu'un vrai repas : financer un repas assis pour 100 étudiants prendrait trop de place dans le budget. Un bon buffet d'accueil le matin et une pause-café l'après-midi font largement l'affaire et coûtent beaucoup moins cher.
4. Utilisation exclusive du matériel de l'IUT : Au lieu de louer du matériel de son ou de vidéo à une entreprise extérieure, nous utilisons uniquement les équipements déjà présents dans l'établissement. Cela nous permet d'économiser de l'argent et de réduire la pollution liée au transport du matériel.

PARTIE 9 :

9. Analyse des risques et modalités de suivi

Pour anticiper les imprévus liés à la "Journée Numérique Responsable", nous avons évalué la criticité (C) des risques majeurs grâce à la méthode AMDEC enseignée, selon la formule :

C = Probabilité d'apparition (P) × Gravité (G) × Non-déTECTabilité (D).

A. Tableau d'analyse des risques (AMDEC)

Risque identifié	Analyse et Conséquences	C = P × G × D	Niveau	Plan d'action (Préventif & Correctif)
1. Défaillance du matériel technique	Panne du vidéoprojecteur ou des micros de l'IUT. Les intervenants ne pourront pas diffuser leurs supports, impactant la qualité de la conférence.	3 × 2 × 1 = 6	Niveau 2 (Moyen)	Préventif : Tester le matériel de l'amphi 48h avant l'événement. Correctif : Prévoir un PC de secours et basculer sur une animation sans écran (tableau blanc).

2. Problème d'organisation (Absences)	Retard ou absence de dernière minute d'un intervenant. Le planning ne sera pas respecté et l'événement perdra en crédibilité.	3 × 3 × 1 = 9	Niveau 3 (Fort)	Préventif : Valider les présences plusieurs semaines à l'avance. Correctif : Transformer le temps de parole vide en table ronde interactive avec les étudiants.
3. Indisponibilité de l'Amphi (Date)	La date du 14 mai est non négociable. Si la réservation de l'amphithéâtre prend du retard, le projet entier est menacé d'annulation.	1 × 3 × 1 = 3	Niveau 1 (Faible)	Préventif : Faire la demande de réservation officielle dès le premier jour du projet (Jalon 1).

B. Modalités de suivi

Un risque n'est pas figé dans le temps. C'est pourquoi ce tableau sera notre outil de pilotage principal. À chaque réunion d'équipe (à chaque validation de nos Jalons), nous ferons un point systématique sur ces 3 risques pour vérifier si leur probabilité a augmenté (par exemple : si la direction tarde à nous confirmer l'amphi, le risque 3 passera en niveau 3) afin de réagir immédiatement.

10. Bilan prévisionnel et retour réflexif

Ce projet d'organisation d'une journée sur le numérique responsable est une très bonne expérience, avec beaucoup de points positifs mais aussi des défis concrets de gestion de projet.

Ce qui a bien fonctionné (Les forces du projet) :

- Un thème porteur : Le sujet (Green IT, IA) est actuel et intéresse facilement les étudiants.
- Une bonne gestion financière : C'est l'une de nos plus grandes réussites. Grâce à nos arbitrages écolos (zéro papier, matériel de l'IUT), nous avons réussi à chiffrer l'événement à 1 580 €, tout en gardant notre marge de sécurité. Nous sommes donc bien en dessous de la limite des 2 000 €.
- La richesse des acteurs : Travailler avec des profils variés (enseignants, intervenants locaux, services de l'IUT) apporte des points de vue différents et enrichit vraiment le contenu de la journée.

Les difficultés rencontrées (Les défis) :

- Les contraintes de temps : La date du 14 mai est fixée à l'avance et non modifiable. Cela impose un planning serré où le moindre retard (vu dans notre diagramme de Gantt) peut faire boule de neige.
- La dépendance aux autres acteurs : Les disponibilités des intervenants ne sont pas toujours garanties. De plus, les étapes de validation par l'administration (la MOA) ou le Service Com' peuvent ralentir l'avancement si elles ne sont pas anticipées.

Comment améliorer le projet (Pistes de réflexion) :

- Mieux anticiper les risques : Comme l'a montré notre tableau AMDEC, il est vital de contacter plusieurs intervenants de secours dès le début pour avoir des plans B prêts à l'emploi.
- Trouver d'autres financements : Le développement de partenariats ou la recherche de sponsors locaux pourrait aider à augmenter les ressources disponibles pour une prochaine édition.
- Lancer la communication plus tôt : Une com' efficace (surtout quand elle est 100 % sur écrans) doit commencer suffisamment tôt pour être sûr d'attirer du monde.

En conclusion : Le projet est pertinent et tout à fait réalisable. Mais ce dossier nous a appris qu'une bonne idée ne suffit pas : elle nécessite une organisation très carrée (qui fait quoi) et une bonne anticipation des imprévus pour se dérouler sans accroc.

11. Contribution individuelle et prise de recul personnelle

Le projet est d'organiser une journée de sensibilisation au numérique responsable pour les étudiants de l'IUT. L'objectif est de les informer sur les impacts du numérique et de proposer des solutions concrètes. Ce projet se déroule dans un contexte actuel important et implique

plusieurs acteurs. J'ai appris à structurer et on devrait plus être précis dans les tâches répartis le projet il est contraint par un budget limité, une date imposée et des validations administratives.

L'objectif principal est d'organiser une journée pour informer au moins 100 étudiants sur l'IA et le numérique responsable avant le 14 mai. Les objectifs secondaires sont de respecter le budget de 2000€, mettre en place une communication digitale efficace, coordonner les différents acteurs et anticiper les risques. Ces objectifs permettent de structurer le projet et de le rendre réalisable.

La matrice RACI permet de clarifier les responsabilités de chaque acteur du projet. Le binôme étudiant joue un rôle central en étant responsable de la majorité des tâches notamment la coordination, la planification et le suivi du projet. La direction de l'IUT intervient principalement en tant que valideur des décisions importantes, celles liées au budget et à l'image de l'établissement. Les services comme la communication et la logistique interviennent dans leurs domaines d'expertise, tandis que les intervenants et les prestataires participent à la réalisation concrète de l'événement. Cette répartition permet d'assurer une organisation claire et d'éviter les confusions dans les responsabilités.

Le diagramme de Gantt permet de planifier les tâches du projet dans le temps. Il montre l'ordre des tâches celles qui peuvent être faites en parallèle et celles qui sont critiques. Il permet de suivre l'avancement d'éviter les retards et j'ai aussi appris à utiliser Gantt et à mieux éviter certains retards.

Le projet présente plusieurs risques notamment techniques, organisationnels et liés aux contraintes de temps. Leur criticité a été évaluée à l'aide de la formule permettant de prioriser les risques. Je proposerais plus de solutions concrètes pour faire des actions de suivi comme des tests techniques sont mises en place pour limiter leur impact.

Contribution individuelle josué :

J'ai participé au cadrage du projet, à la définition des objectifs, à la répartition des rôles avec la matrice RACI, à la réalisation du planning ainsi qu'à l'analyse des risques. Ce projet m'a permis d'apprendre à organiser un projet de manière structurée, à gérer le temps et à anticiper les problèmes liés à l'organisation. Avec du recul j'aurais pu être plus précis dans certaines parties comme dans la planification et l'analyse des risques et mieux anticiper certaines difficultés.

Contribution individuelle Abd-Al-Ghani :

Partie 2 : J'ai défini les limites du projet et proposé nos premiers grands arbitrages (la stratégie "Zéro papier").

Partie 4 : J'ai structuré l'organisation de l'équipe en appliquant le cours (séparation MOA/MOE) et j'ai réalisé la matrice RACI pour clarifier les responsabilités de chacun et éviter les conflits d'autorité.

Partie 6 : J'ai participé à la structuration logique des tâches pour préparer le terrain au planning.

Partie 8 : J'ai conçu le budget prévisionnel de 2 000 € en intégrant une marge de sécurité vitale (400 €) et en justifiant nos choix économiques (intervenants locaux, matériel de l'IUT).

Partie 10 : J'ai défini les indicateurs de réussite pour évaluer objectivement la performance de notre événement après le jour J.
